

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2025-GG-EPS EMAPAT S.A.**

Puerto Maldonado, 22 de abril del 2025.

**VISTO:**

Informe N° 225-2025-GO-EPS EMAPAT S.A. de fecha 10 de abril del 2025; Informe N° 225-2025-DOyP-GO-EPS EMAPAT S.A./FYCHE. de fecha 09 de abril del 2025; Informe N° 011-2025-DOyP-GO-EPS EMAPAT S.A. de fecha 02 de abril del 2025; Carta N° 007-2024 CONSORCIO SUPERVISOR TRIUNFO W&A/EMAPAT de fecha 26 de marzo del 2025; Informe N° 002-2025/CST/RNRC de fecha 27 de marzo del 2025; Carta N° 005-2025/C.AMAZONIA/GO de fecha 24 de marzo del 2025.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la EPS EMAPAT S.A., responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio con las facultades y atribuciones que señala el Estatuto de la Empresa y los documentos de gestión institucional. Asimismo, decide el manejo de la sociedad cumpliendo las políticas y estrategias que señala el Directorio y la Junta General de Accionistas.


Que, mediante Carta N° 005-2025/C.AMAZONIA/GO de fecha 24 de marzo del 2025, el Gerente de Obra del Consorcio Amazonia y el Supervisor de Obra del Consorcio Triunfo W&A, hace entrega de los calendarios de actualización de ejecución de obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS". Asimismo, adjunta el Informe N° 005-2025-CA/MRPR-RO, de fecha 20 de marzo del 2020, realizado por el Residente de Obra, en el que detalla el avance programado de acuerdo a la programación realizada por la residencia de obra:

MESES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Porcentaje del Avance	1.19%	4.97%	16.00%	45.87%	29.97%	2.00%
Porcentaje de Avance Acumulado	1.19%	6.16%	22.16%	68.03%	98.00%	100.00%

Que, mediante Informe N° 002-2025/CST/RNRC de fecha 27 de marzo del 2025, el Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor Triunfo W&A, emite la conformidad de 1) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM); 2) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO; 3) CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" con CUI N° 2472850; conforme al análisis y revisión de los siguientes:

**1) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM)**

(...) *está programado con 150 días calendarios, que inicia 18 de marzo 2025 y culmina el 14 de agosto de 2025 el cual corresponde al inicio de obra según acta y al periodo de ejecución según la oferta del contratista y el expediente técnico, también se ha verificado la correlación de las actividades de dicho programa (...)*

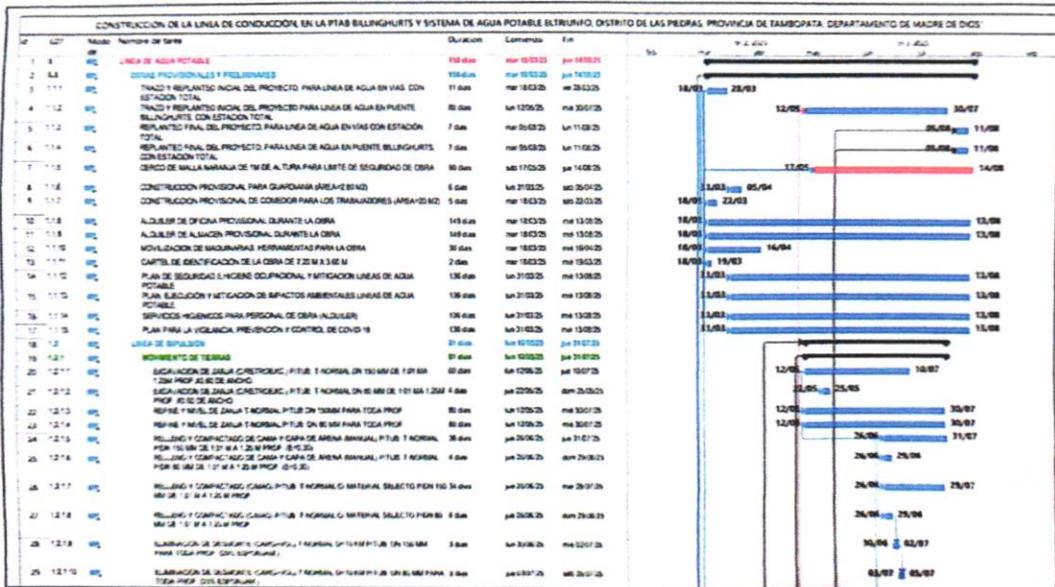

## 2) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

(...) está programado con 150 días calendarios, como lo indica el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), dicho calendario consta la valorización de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato (...)

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA PTAS BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Distrito : Tambopata  
Provincia : Tambopata  
Región : Madre de Dios

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Marzo 19-31	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto 01-
						Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
01	LÍNEA DE AGUA POTABLE				1,497,448.79						
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES				178,071.33						
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEA DE AGUA EN VÍAS CON ESTACION TOTAL	km	1.11	1,315.00	1,469.65	1,469.65					
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LÍNEA DE AGUA EN PUENTE BILLINGHURTS, CON ESTACION TOTAL	km	1.07	1,661.00	1,777.27			444.32	696.48	696.48	
01.01.03	REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEA DE AGUA EN VÍAS CON ESTACION TOTAL	km	1.11	1,005.00	1,116.86						1,116.86
<b>Gastos Generales</b>											
	Gastos Generales Fijos		1.47%	S/.	22,098.43	262.03	1,096.73	3,531.58	10,122.44	6,914.53	441.11
	Gastos Generales Variables		18.05%	S/.	270,359.12	3,210.16	13,436.01	43,265.20	124,039.51	81,034.22	5,404.01
	<b>Total Gastos Generales (B)</b>			S/.	<b>292,427.55</b>	<b>3,472.19</b>	<b>14,532.74</b>	<b>46,796.78</b>	<b>134,131.96</b>	<b>87,948.75</b>	<b>5,845.12</b>
	Utilidad (C)		6.91%	S/.	90,000.00	1,068.63	4,472.72	14,402.58	41,281.60	26,975.53	1,798.95
	<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>			S/.	<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>93,423.94</b>	<b>300,833.69</b>	<b>862,269.04</b>	<b>663,461.14</b>	<b>37,573.46</b>
	IDV			S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Presupuesto Total</b>			S/.	<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>93,423.94</b>	<b>300,833.69</b>	<b>862,269.04</b>	<b>663,461.14</b>	<b>37,573.46</b>
	<b>Presupuesto Total Acumulado</b>			S/.	<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>115,744.97</b>	<b>416,678.66</b>	<b>1,278,847.70</b>	<b>1,842,288.84</b>	<b>1,879,874.30</b>
	Porcentaje de Avance				1.19%	4.97%	16.00%	45.87%	68.03%	98.00%	100.00%
	Porcentaje de Avance Acumulado				1.19%	6.16%	22.16%	68.03%	98.00%	100.00%	

## 3) CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS

(...) está programado con 150 días calendarios, como lo indica el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), el cual se verifica las fechas los cuales tendrá que adquirir los materiales y estén a tiempo en la obra para su utilización oportuna (...)

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRO	PRECIO SI	PARCIAL SI	Marzo 18-31	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto 01-15
01	LÍNEA DE AGUA POTABLE			1,497,446.75							
01.02	LÍNEA DE IMPULSION			1,108,059.41							
01.03	CAMARAS DE DERIVACION EN LINEA DE IMPULSION			31,279.56							
01.04	CAMARA DE REUNION EN LINEA DE IMPULSION			14,584.95							
01.05	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL			96,169.29							
01.06	PILETE TERRESTRE			43,153.15							
01.07	LIMPIEZA DE OBRA			4,833.20							
01.08	MONITOREO ARQUEOLOGICO			26,990.00							
<b>Costo Directo (A)</b>					<b>1,497,446.75</b>	<b>17,780.21</b>	<b>74,418.47</b>	<b>239,634.34</b>	<b>686,855.48</b>	<b>448,826.86</b>	<b>29,931.38</b>
<b>Gastos Generales</b>											
	Gastos Generales Fijos	1.47%	SI	22,068.43	282.03	1,059.73	3,631.58	10,122.44	6,614.63	441.11	
	Gastos Generales Variables	18.06%	SI	270,366.12	3,210.16	13,436.71	43,269.27	124,035.51	81,034.27	5,424.31	
<b>Total Gastos Generales (B)</b>					<b>292,434.55</b>	<b>3,492.19</b>	<b>14,496.44</b>	<b>46,900.85</b>	<b>130,672.82</b>	<b>87,083.01</b>	<b>5,865.42</b>
<b>Utilidad (C)</b>					<b>90,000.00</b>	<b>1,068.63</b>	<b>4,472.72</b>	<b>14,402.50</b>	<b>41,281.60</b>	<b>26,975.53</b>	<b>1,738.95</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>					<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>93,427.63</b>	<b>300,833.69</b>	<b>862,269.04</b>	<b>563,451.14</b>	<b>37,575.46</b>
<b>IGV</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto Total</b>					<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>93,427.63</b>	<b>300,833.69</b>	<b>862,269.04</b>	<b>563,451.14</b>	<b>37,575.46</b>
<b>Presupuesto Total Acumulado</b>					<b>1,879,874.30</b>	<b>22,321.03</b>	<b>115,744.97</b>	<b>416,578.66</b>	<b>1,278,847.70</b>	<b>1,842,298.84</b>	<b>1,879,874.30</b>
<b>Porcentaje de Avance</b>					<b>1.19%</b>	<b>4.97%</b>	<b>16.00%</b>	<b>22.16%</b>	<b>68.03%</b>	<b>98.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Porcentaje de Avance Acumulado</b>					<b>1.19%</b>	<b>6.16%</b>	<b>22.16%</b>	<b>68.03%</b>	<b>98.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Que, mediante Carta N° 007-2024 CONSORCIO SUPERVISOR TRIUNFO W&A/EMAPAT de fecha 26 de marzo del 2025, el representante común del Consorcio Triunfo &A, emite la respectiva conformidad del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM); CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" con CUI N° 2472850; solicitando la evaluación y aprobación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 011-2025-DOyP-GO-EPS EMAPAT S.A. de fecha 02 de abril del 2025, el Especialista en Administración de Contratos, luego de la revisión y análisis de los documentos concluye que "(...) se acoge a la recomendación del supervisor Ing. Napoleón Ríos Córdova, por lo tanto esta coordinación aprueba el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION DE OBRA CPM; siendo la fecha de inicio el 18 de marzo del 2025 y la fecha de termino de plazo contractual el 14 de agosto del 2025" y "de la revisión del calendario avance de obra valorizado actualizado presentado por el contratista Consorcio Amazonia se observa que tiene una adecuada distribución de los avances mensuales estando conforme".

Item	Descripción	Unid.	Metro	Precio SI	Parcial SI	Marzo 18-31	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto 01-15
01	LÍNEA DE AGUA POTABLE			1,497,446.75							
01.02	LÍNEA DE IMPULSION			1,108,059.41							
01.03	CAMARAS DE DERIVACION EN LINEA DE IMPULSION			31,279.56							
01.04	CAMARA DE REUNION EN LINEA DE IMPULSION			14,584.95							
01.05	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL			96,169.29							
01.06	PILETE TERRESTRE			43,153.15							
01.07	LIMPIEZA DE OBRA			4,833.20							
01.08	MONITOREO ARQUEOLOGICO			26,990.00							

Costo Directo (A)	SI	1,497,446.75	17,780.21	74,418.47	239,634.34	686,855.48	448,826.86	29,931.38
Gastos Generales								
Gastos Generales Fijos	1.47%	SI	22,068.43	282.03	1,059.73	3,631.58	10,122.44	6,614.63
Gastos Generales Variables	18.06%	SI	270,366.12	3,210.16	13,436.71	43,269.27	124,035.51	81,034.27
Total Gastos Generales (B)		SI	292,434.55	3,492.19	14,496.44	46,900.85	130,672.82	87,083.01
Utilidad (C)	6.81%	SI	90,000.00	1,068.63	4,472.72	14,402.50	41,281.60	26,975.53
SUB TOTAL (A+B+C)		SI	1,879,874.30	22,321.03	93,427.63	300,833.69	862,269.04	563,451.14
IGV		SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Total		SI	1,879,874.30	22,321.03	93,427.63	300,833.69	862,269.04	563,451.14
Presupuesto Total Acumulado		SI	1,879,874.30	22,321.03	115,744.97	416,578.66	1,278,847.70	1,842,298.84
Porcentaje de Avance			1.19%	4.97%	16.00%	22.16%	68.03%	98.00%
Porcentaje de Avance Acumulado			1.19%	6.16%	22.16%	68.03%	98.00%	100.00%



Que, mediante Informe N° 225-2025-DOyP-GO-EPS EMAPAT S.A./FYCHE. de fecha 09 de abril del 2025, el jefe del Departamento de Obras y Proyectos, remite al Gerente de Operaciones el Informe 011-2025-DOyP-GO-EPS EMAPAT S.A., y la Carta N° 007-2024 CONSORCIO SUPERVISOR TRIUNFO W&A/EMAPAT, para la aprobación de CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y PROGRAMACION CPM.

Que, mediante Informe N° 225-2025-GO-EPS EMAPAT S.A. de fecha 10 de abril del 2025, el Gerente de Operaciones, solicita mediante acto resolutivo la aprobación del CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACIÓN DE OBRA CPM, presentado por el contratista CONSORCIO AMAZONIA de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" con CUI N° 2472850.

Que, con las facultades especiales debidamente inscritas en el Asiento N° C00101 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Madre de Dios, Zona Registral N° X, correspondiente a la "EPS EMAPAT S.A.", estando a las facultades conferidas al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones, de acuerdo a los Estatutos de la Empresa Prestadora de Servicios, y contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM); CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, de la obra IOARR "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" con CUI N° 2472850; por las razones expuestas en la parte considerativa, y conforme al siguiente detalle:**

OBRA	:	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA CONDUCCIÓN; EN LA PTAP BILLINGHURST Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" con CUI N° 2472850
LOCALIDAD	:	EL TRIUNFO
DISTRITO	:	LAS PIEDRAS
PROVINCIA	:	TAMBOPATA
DEPARTAMENTO	:	MADRE DE DIOS
SITEMA DE CONTRATACION	:	PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD LICITANTE	:	EPS EMAPAT SA
CONTRATO	:	N° 01-2025-EPS
CONTRATISTA EJECUTOR	:	CONSORCIO AMAZONIA
PRESUPUESTO	:	S/. 1,879,874.30 (SIN IGV)
CONTRATO DE SUPERVISION	:	N° 05-2024-EPS EMAPAT
SUPERVISOR	:	CONSORCIO SUPERIOR TRIUNFO W&A
PRESUPUESTO	:	S/. 128,822.39 (SIN IGV)

EJECUCION DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	18 DE MARZO DEL 2025
INICIO REAL DE OBRA	:	18 DE MARZO DEL 2025
TERMINO DE OBRA	:	18 DE AGOSTO DEL 2025



**ARTICULO SEGUNDO: DISPONER** que el departamento de Obras y Proyectos y departamento de Logística y Control Patrimonial, efectúen las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder para el cumplimiento de la presente resolución y los demás que corresponden de acuerdo a sus competencias.



**ARTÍCULO TERCERO:** Disponer que el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de la EPS EMAPAT SA., proceda a publicar la presente resolución en el Portal de la Institución ([www.emapat.com.pe](http://www.emapat.com.pe)).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



Distribución  
G.A.F.  
G.O.  
G.C.  
G.P.P.  
O.CI.  
Archivo.  
VARR/LSC



**E.P.S. EMAPAT S.A.**  
Ing. Victor Alberto Renteros Ramirez  
GERENTE GENERAL

